Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI VALCHIUSA
Largo Gillio, 1
10089 Valchiusa (TO) - Italy

PROGETTO ARCHITETTONICO

GSTUDIO ARCHITETTI
STP SS di ENRICO GIACOPELLI E MAURO FALLETTI
Lungo Po Antonelli 45 - 10153 Torino
info@g-studio.biz - www.g-studio.biz
T.+F. +39 011 884 286

PROGETTO IMPIANTI FLUIDO MECCANICI ED ELETTRICI

MCM INGEGNERIA GRUPPO DIMENSIONE
MCM INGEGNERIA S.r.l
Vicolo Monti 8 - 10095 Grugliasco (TO)

PROGETTO STRUTTURE

ING. PAOLO ORIA
Via Torino 17 - 10082 Cuorgnè (To)
info@ingter.it
T. +39 0124 629 055

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. SAUDINO" CUP H27G22000040006

Progetto finanziato nell'ambito del PNRR e dall'Unione Europea Next Generation EU

Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva
CUP H24I20000010001 CIG: 8797332C04

| Rev. n. | Data | Descrizione | Redatto da |
|---|---|---|---|
| | 30/11/2022 | Prima emissione | MCM |
| 01 | | | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |

**PROGETTO ESECUTIVO**

OGGETTO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(ai sensi dell'art. 100 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
ALLEGATO A - Cronoprogramma

SCALA -

Il progettista si riserva ai termini di legge la proprieta' di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi. L'esecutore del presente lavoro si impegna a rispettare l'esclusiva. E' vietato asportare il timbro da questo disegno. Tutte le misure si considerano al finito e devono essere controllate dall'esecutore del lavoro sul cantiere. Ogni modifica sostanziale rispetto al presente disegno deve essere approvata dal progettista.

ELABORATO N°.

PSC03
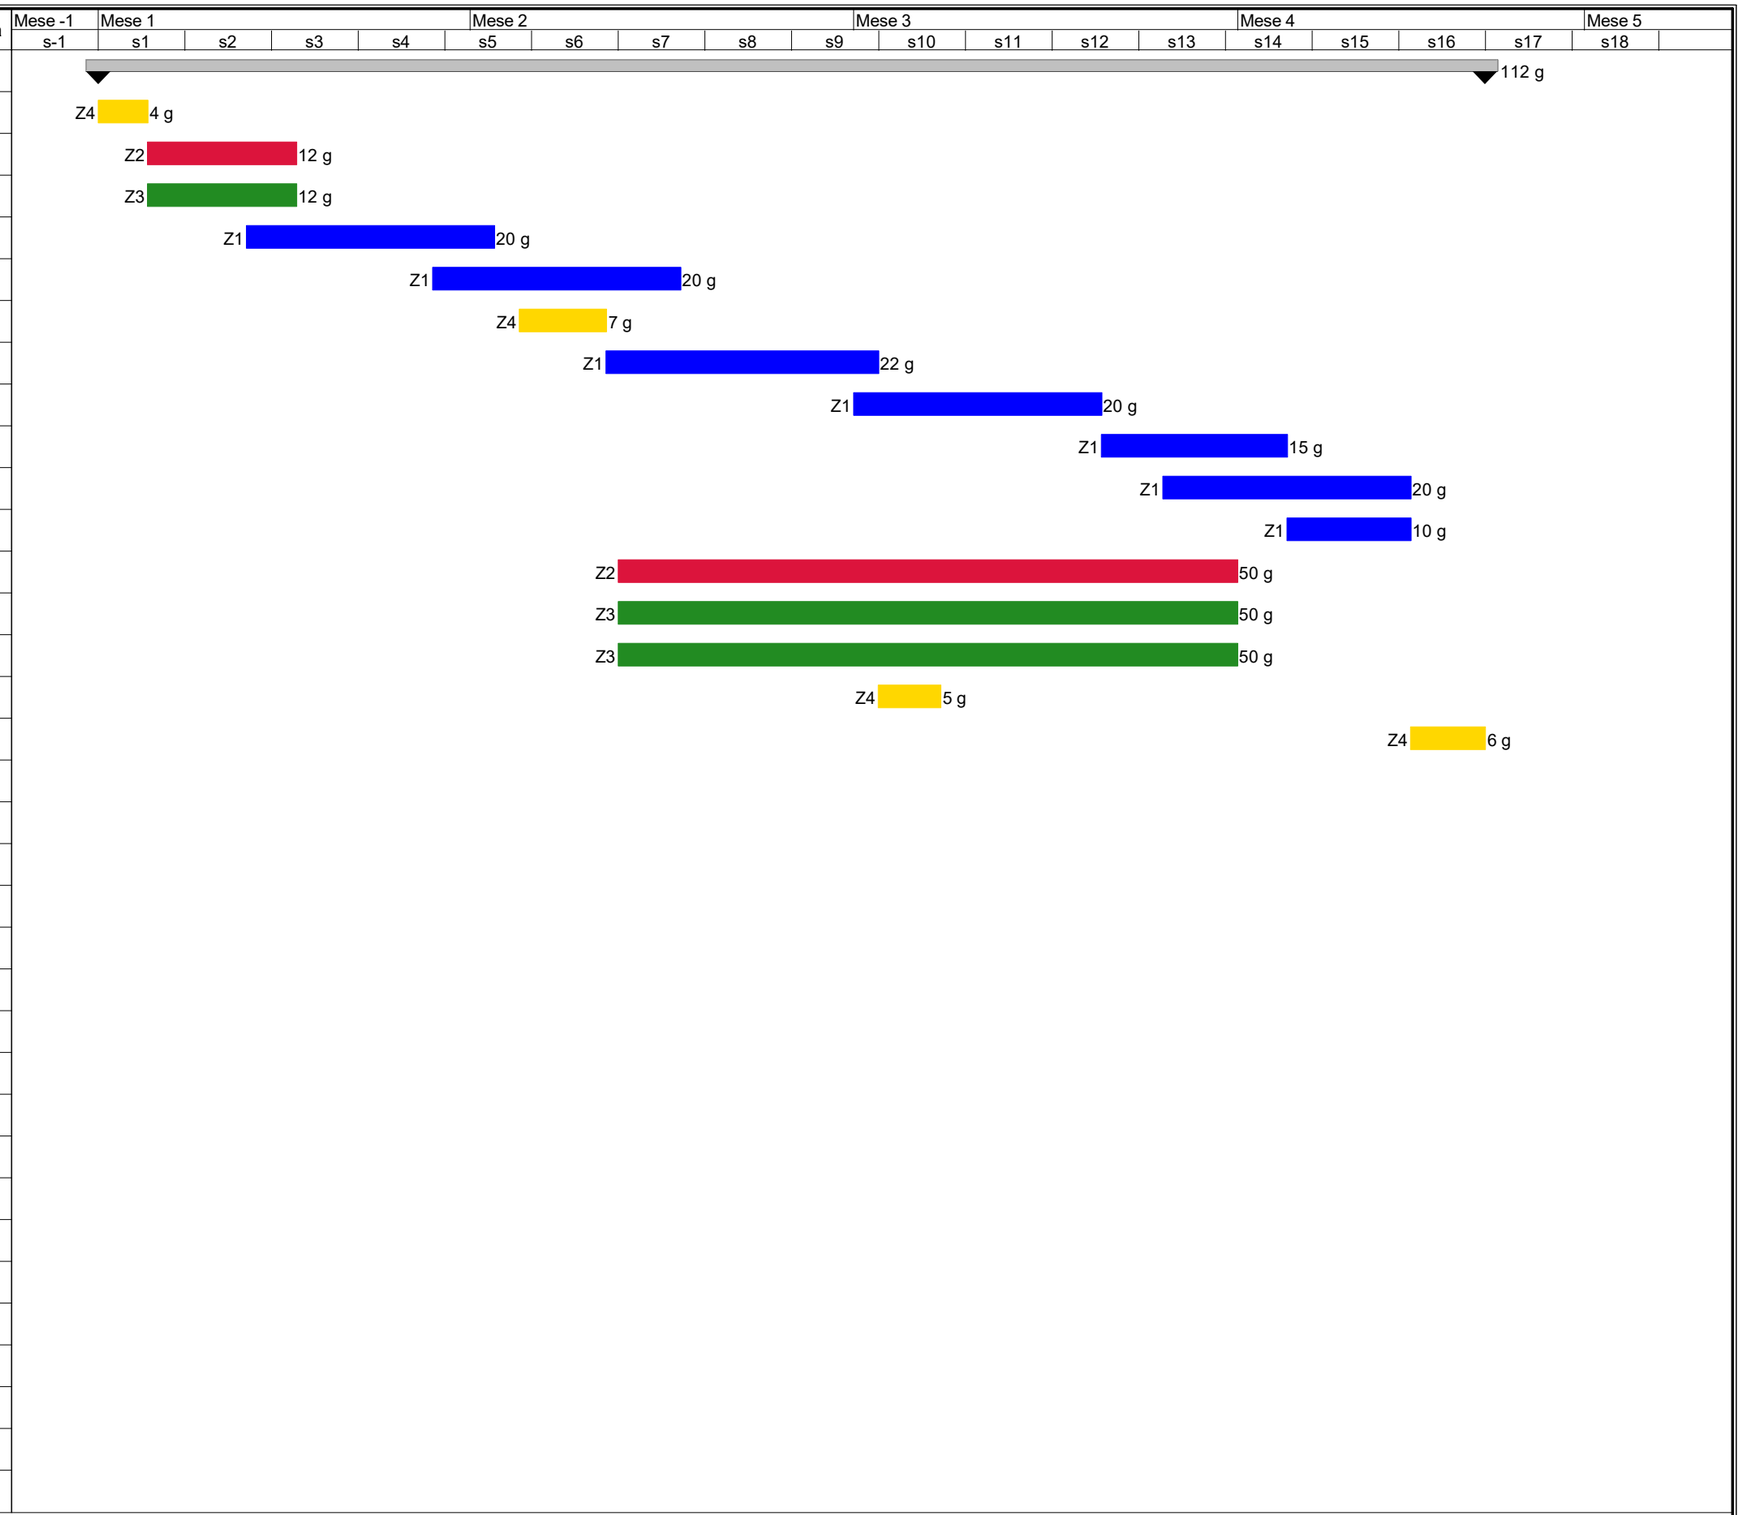
| Nome attività | Durata |
|---|---|
| **Mensa** | 112 g |
| Cantierizzazione (recinzioni, baracche, cartellonistica) | 4 g |
| Demolizione impianti meccanici | 12 g |
| Demolizione impianti elettrici | 12 g |
| Demolizioni edili | 20 g |
| Realizzazione pareti | 20 g |
| Realizzazione ponteggio | 7 g |
| Cappotto verticale/orizzontale | 22 g |
| Pavimenti ed intonaci | 20 g |
| Controsoffitti | 15 g |
| Serramenti e finiture | 20 g |
| Tinteggiature | 10 g |
| Impianti meccanici/termofluidici | 50 g |
| Impianti elettrici - Distribuzione principale | 50 g |
| Impianti elettrici - Illuminazione e FM | 50 g |
| Rimozione ponteggio | 5 g |
| Rimozione cantierizzazione e pulizia area | 6 g |
| | |
| | |
| **LEGENDA Zona:** | |
| Z1 = Opere edili | |
| Z2 = Impianti meccanici | |
| Z3 = Impianti elettrici | |
| Z4 = Opere Generali | |
